

広域ごみ処理施設 整備ニュース

令和5年
第10号

【発行】
五泉地域衛生施設組合

〒959-1604
五泉市論瀬 8864
☎0250(43)3852
<http://gosen-eisei.jp>

中間処理施設建設工事 進捗状況について

令和3年10月に着工しました
中間処理施設建設工事の進捗状
況をお知らせします。

令和4年7月から行っていた
地盤改良工事（柱状改良工法
合計1,367本）が11月に完
了しました。※写真①

令和4年10月から工場棟部分
の土工事（掘削、砕石敷き均
し・捨てコンクリート打設）を
行っています。※写真②

令和5年2月20日現在では、
工場棟ごみピット部分の基礎工
事（鉄筋組立・型枠設置・コンク
リート打設）を行っています。

※写真③④

写真①




改良杭の高さを揃える作業をしています。

写真②



計画の深さまで土を掘削しています。

写真③

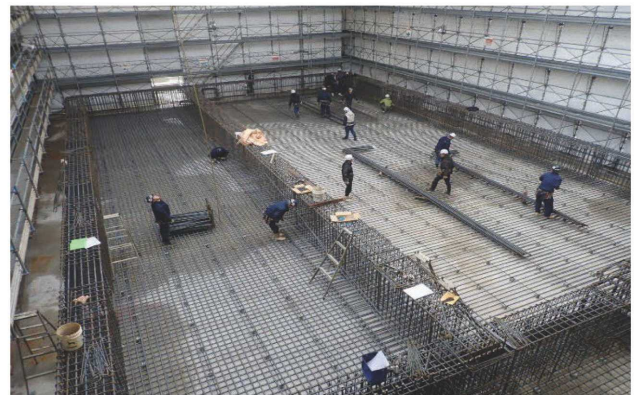

ごみピットの床や壁、梁などに鉄筋を配置しています。

写真④



コンクリートの打設を行っています。

進捗を上空から望む



2台の地盤改良機が作業を進めています。（8月）



場内各所で工事が進んでいます。（1月）

現在行なっている工場棟の地下工事は、令和5年5月頃に完了する予定です。

その後は、地上部分の鉄筋工事、型枠工事、コンクリート工事、鉄骨工事等を行います。令和5年8月頃からは、建築工事と並行してプラント工事を開始します。プラント工事では、焼却炉を含むごみ処理機器の据え付け、配管工事等を行います。

一部の外構工事を除き、令和6年10月頃には施設が完成し、令和7年3月末の竣工に向けて試運転を行い、ごみ処理機器の調整や性能を確認するスケジュールとなっています。

燃料や資材の高騰、供給網の混乱等の不安定な状況ですが、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

年	2022(令和4)年												2023(令和5)年												2024(令和6)年												2025年		
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
マイルストーン							▼ 建築工事着工												▼ プラント工事着工															▼ 受電			竣工 ▼		
建設工事	造成工事																																						
	建築工事(地下工事)																																						
													建築工事(地上工事)																										
													プラント工事																										
																																					試運転		

小型充電式電池（リチウムイオン）

オン電池など）を使用した製品が適切に分別されない事が原因で、ごみ収集車や中間処理施設（焼却場・不燃物処理センターなど）で毎年数多くの火災事故が発生しています。

ひとたび火災が発生すると、廃棄物の円滑な処理に支障をきたすばかりでなく、作業員の人

充電式の機器は、過度な力が加わると
激しく発熱・発火する危険があります



出典：公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会

命が危険にさらされてしまいます。また、施設や車両の修繕や入れ替え、ごみの代替処分の委託費などに多額の費用がかかってしまいます。

ごみを正しく分別することは、ごみの減量化だけでなく、作業員の安全確保、費用の削減にもつながります。

電子機器を捨てる際は、お住まいの市町の分別ルールを確認してお出しいただくようお願いいたします。
